

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE
SEKCYJA ZAKŁAD KOMINIARSKI ZR 17
WALERZYCH
ul. Różana 1, tel. (71) 643-27-32
NIP 662-086-29-84

Szczawno-Zdrój dnia 14.09.2015r.

Opinia Nr 006540

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Fabiana nr 14/1 w Dąbrowie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Szczawienko

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 6 może być przeznaczony do podłączenia kotła COz zamkniętego komina. Podłączenie wykonać zgodnie z wymogami producenta i w oparciu o projekt.
2. Wentylację wsporną, kładzie można wykonać do przepływu nr 8.
3. Wentylację wsporną Takienki wykonać wg obowiązujących przepisów - projektu (istniejąca, zlikwidować).
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia uwiecznione.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Pavo, Marcin Burać

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Szczawienko

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój


Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
Pieczęć i podpis

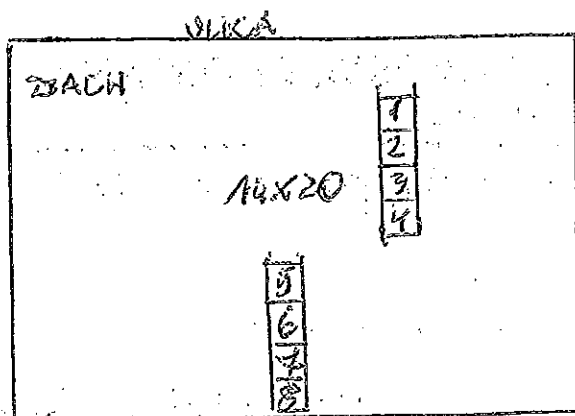

SZKIC ORIENTACYJNY

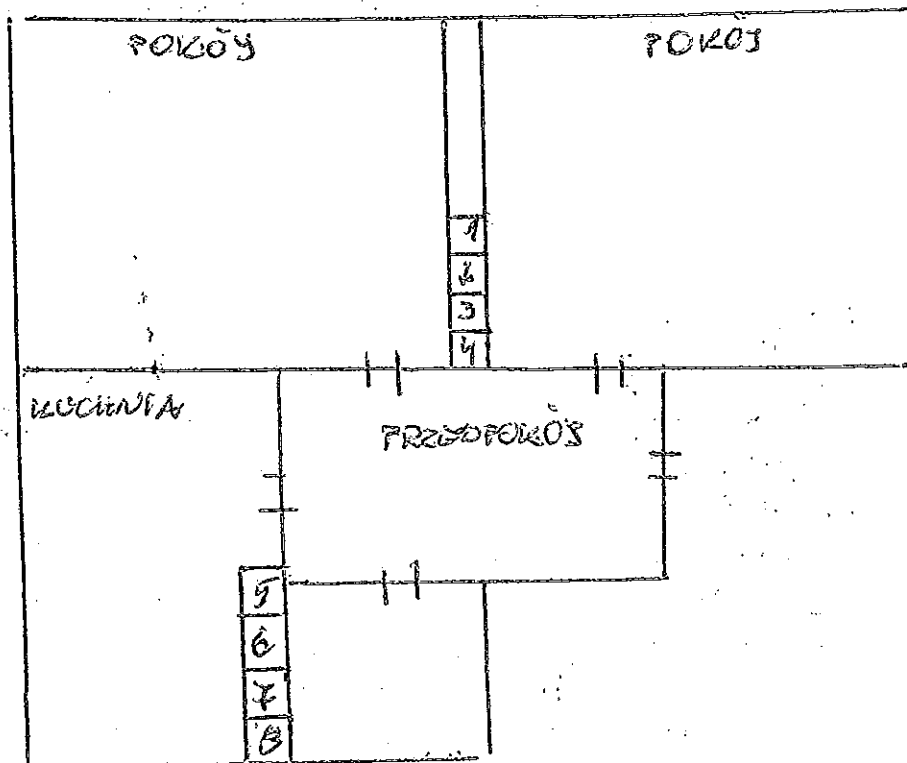

	1	2	3	4	5	6	7	8	
STYK H P									N-3
I P					Wk 2	LOG 2	Wk 2		N-2
PARTER					Wk X				N-1
PUNKT									

DEKA
