

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 56-310 SZCZAWNO ZDUJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 896-000-20-54

Szczawno Zduj dnia 03.07.2018 r.
Stary Zdrój Wałbrzych
11.17.2018

Opinia Nr 008719

Z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Bardowskiego nr 33A/5 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Stawy Zduj

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Po likwidacji pieca CO oraz zamontowaniu wkładu spalnicowego, przewód kominowy nr. 1 może być przeznaczony do podłączenia kotła gazowego CO dla którego zaciąg powietrza wykonaci z boku budynku.
2. Wentylacja wywiewowa kuchni istniejąca w przewodzie nr. 2.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez wrota zewnętrzne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Kabuda, Remigiusz Sajdak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Stawy Zduj
1 egz. dla RZK Szczawno Zduj

Potwierdzenie odbioru opinii:



dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Pieczęć i podpis

M-7	$\frac{1}{2}$	COR	$\frac{1}{2}$	OK	$\frac{1}{2}$
M-6	$\frac{1}{2}$	COR	$\frac{1}{2}$	OK	$\frac{1}{2}$
M-5	$\frac{1}{2}$	COR	$\frac{1}{2}$	OK	$\frac{1}{2}$
M-3	$\frac{1}{2}$	COR	$\frac{1}{2}$	OK	$\frac{1}{2}$
M-2	$\frac{1}{2}$	COR	$\frac{1}{2}$	OK	$\frac{1}{2}$

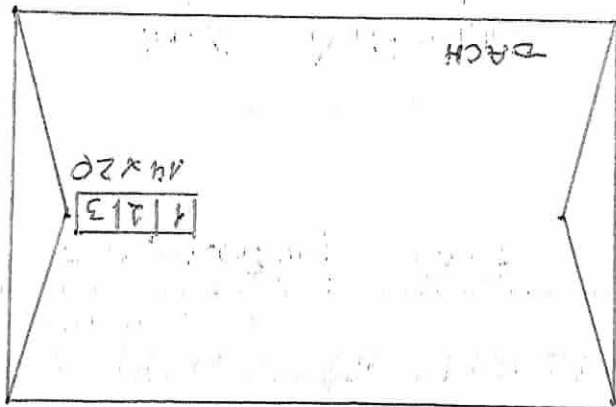

52410 PRELIMINARY
